



www.buenosaires.gob.ar/subte

Empresa : Servisur

Dirección de la obra : Agüero 48 CABA

Fecha de inicio: 10-01-2024

Descripción:


Por medio de este documento se deja constancia de las tareas ejecutadas por la empresa Servisur S.R.L en el edificio de SBASE sede Agüero, con el fin de realizar una salida auxiliar hacia dicha calle en caso de emergencias.

FIRMA




SALIDA AUXILIAR SBASE Y EMOVA

- Replanteo y nivelación de trabajos a realizar
- Limpieza del espacio a trabajar.
- Portón metálico existente.
- Cámara de seguridad existente en pasillo interior.

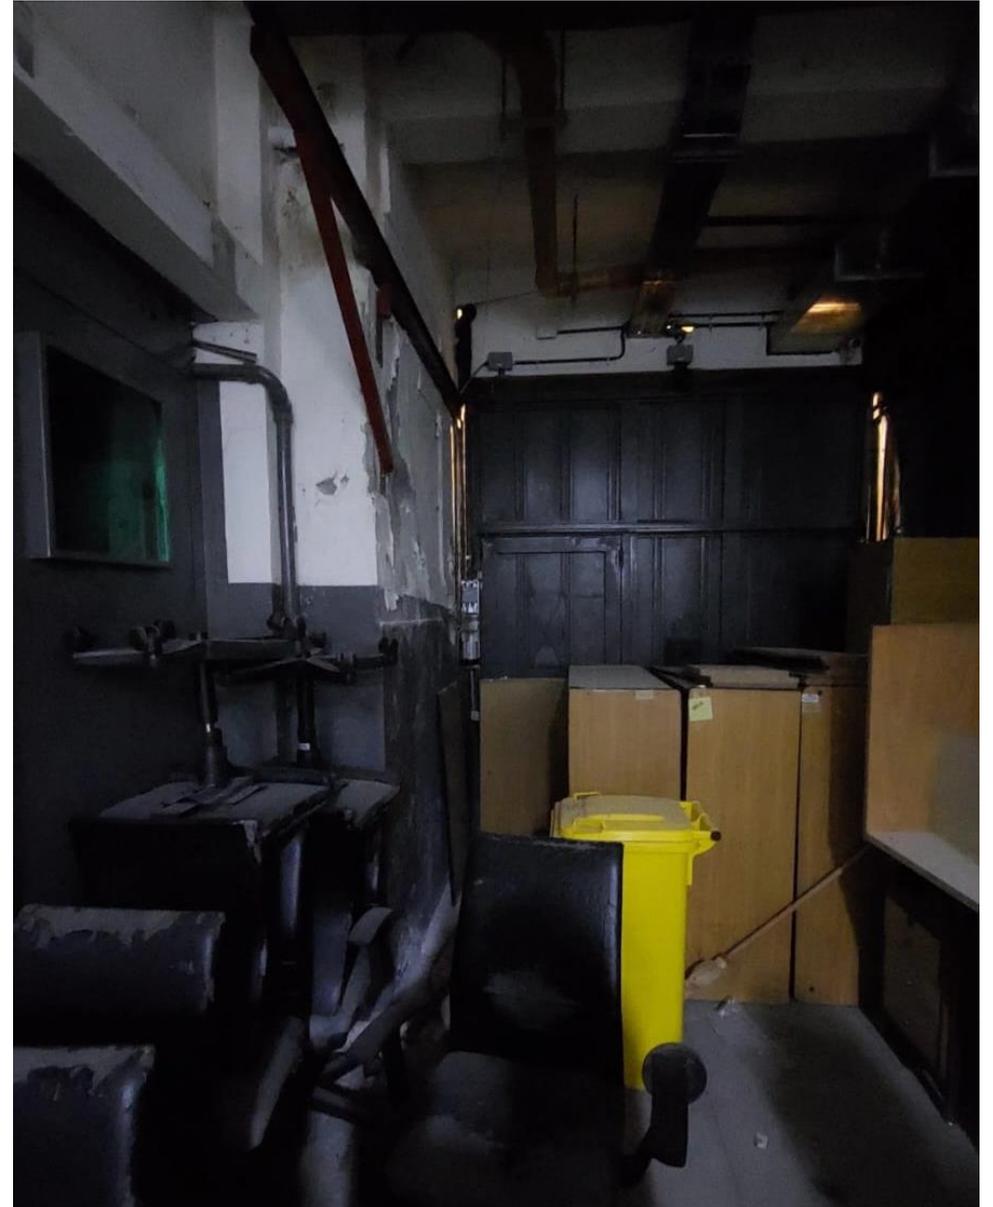

SALIDA AUXILIAR SBASE Y EMOVA

- Retiro y transporte de cámara de seguridad.
- Se observa portón de entrada existente
- Limpieza de espacio a trabajar durante la obra
- Bandejas de electricidad existentes.
- Espacios sin mampostería existente.

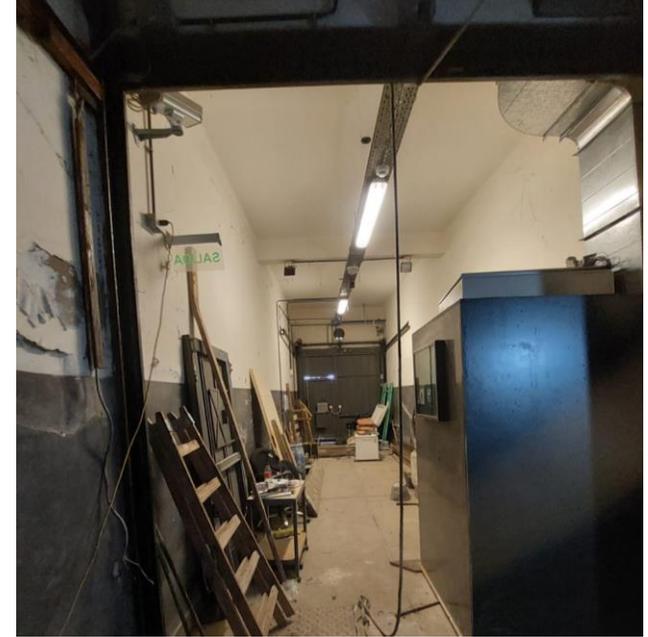

SALIDA AUXILIAR SBASE Y EMOVA




- Demolición de mampostería
- Demolición de piso y contrapiso
- Construcción de carpeta de hormigón

SALIDA AUXILIAR SBASE Y EMOVA



- Demolición de mampostería
- Demolición de piso y contrapiso
- Construcción de carpeta y contrapiso.

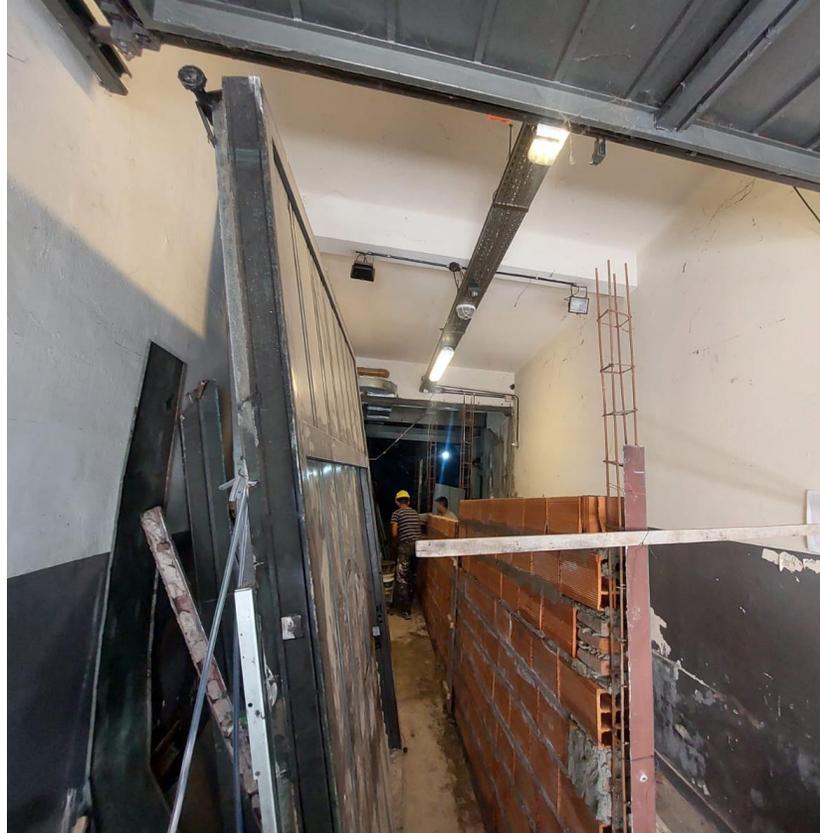


SALIDA AUXILIAR SBASE Y EMOVA

- Retiro de portón metálico existente
- Construcción de mampostería de ladrillo hueco de 12 CM.



SALIDA
AUXILIAR
SBASE Y
EMOVA

SALIDA AUXILIAR SBASE Y EMOVA

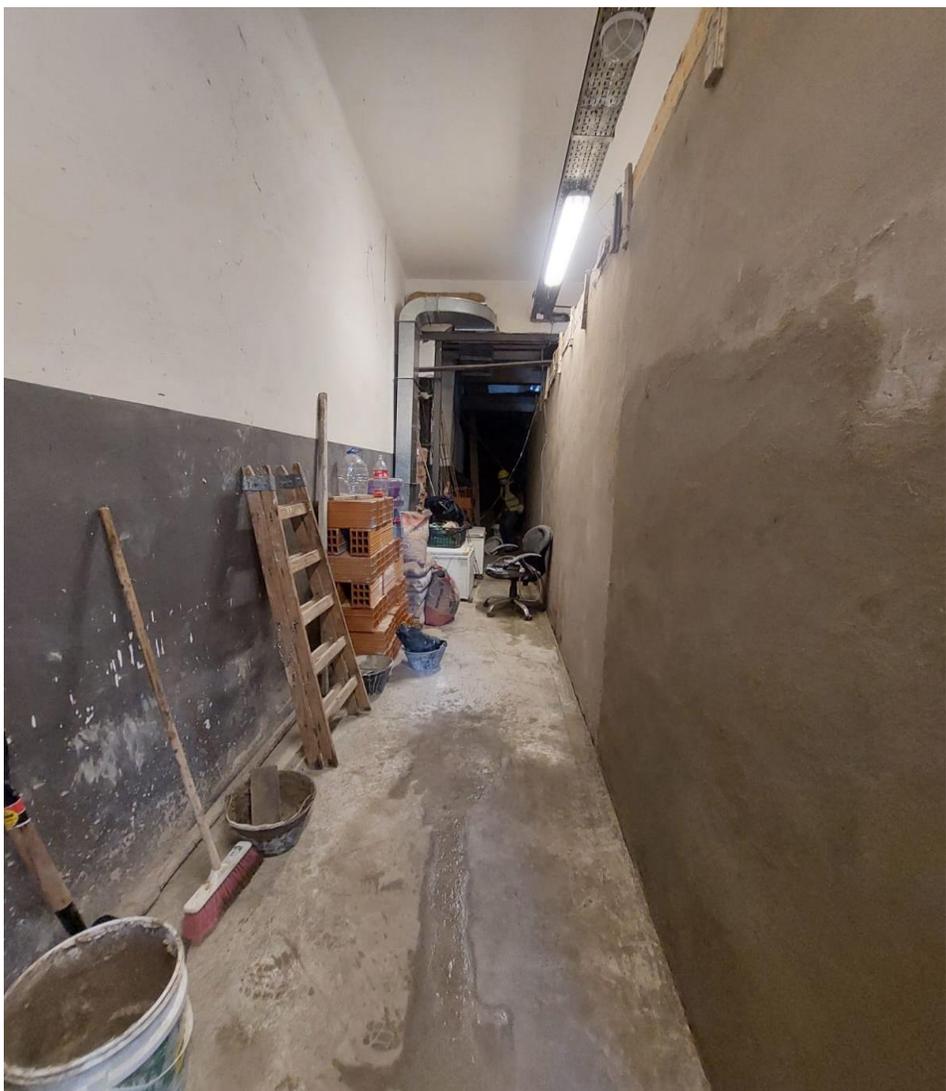




- Revoque y pintura de pasillo interior
- Limpieza
- Construcción de mampostería



SALIDA
AUXILIAR
SBASE Y
EMOVA

SALIDA AUXILIAR SBASE Y EMOVA

- Revoque y pintura de pasillo interior
- Reemplazo de placas de Durlock 0,62 x 1,22.
- Bandejas de electricidad

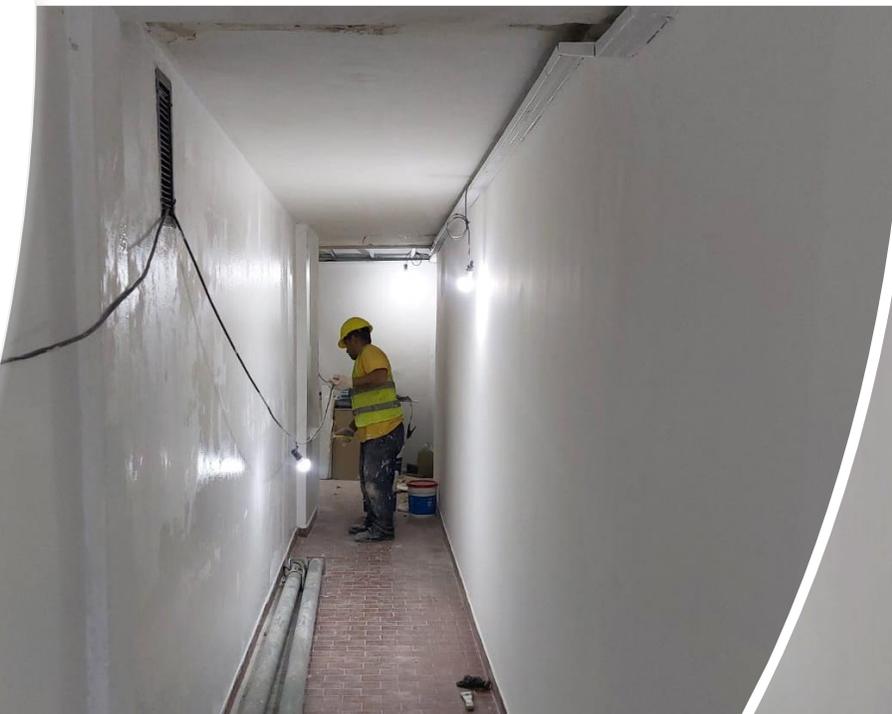



SALIDA AUXILIAR SBASE Y EMOVA


- Construcción de cielorraso suspendido de Durlock con sus respectivas medidas.




- Demolición de losa de hormigón
- Cerramiento con piezas de Durlock y placas cementicias de 12 mm .
- Construcción de escalera metálica de semilla de melón.


SALIDA AUXILIAR SBASE Y EMOVA

- Demolición de losa de hormigón
- Cerramiento con piezas de Durlock y placas cementicias de 12 mm .
- Construcción de escalera metálica de semilla de melón.

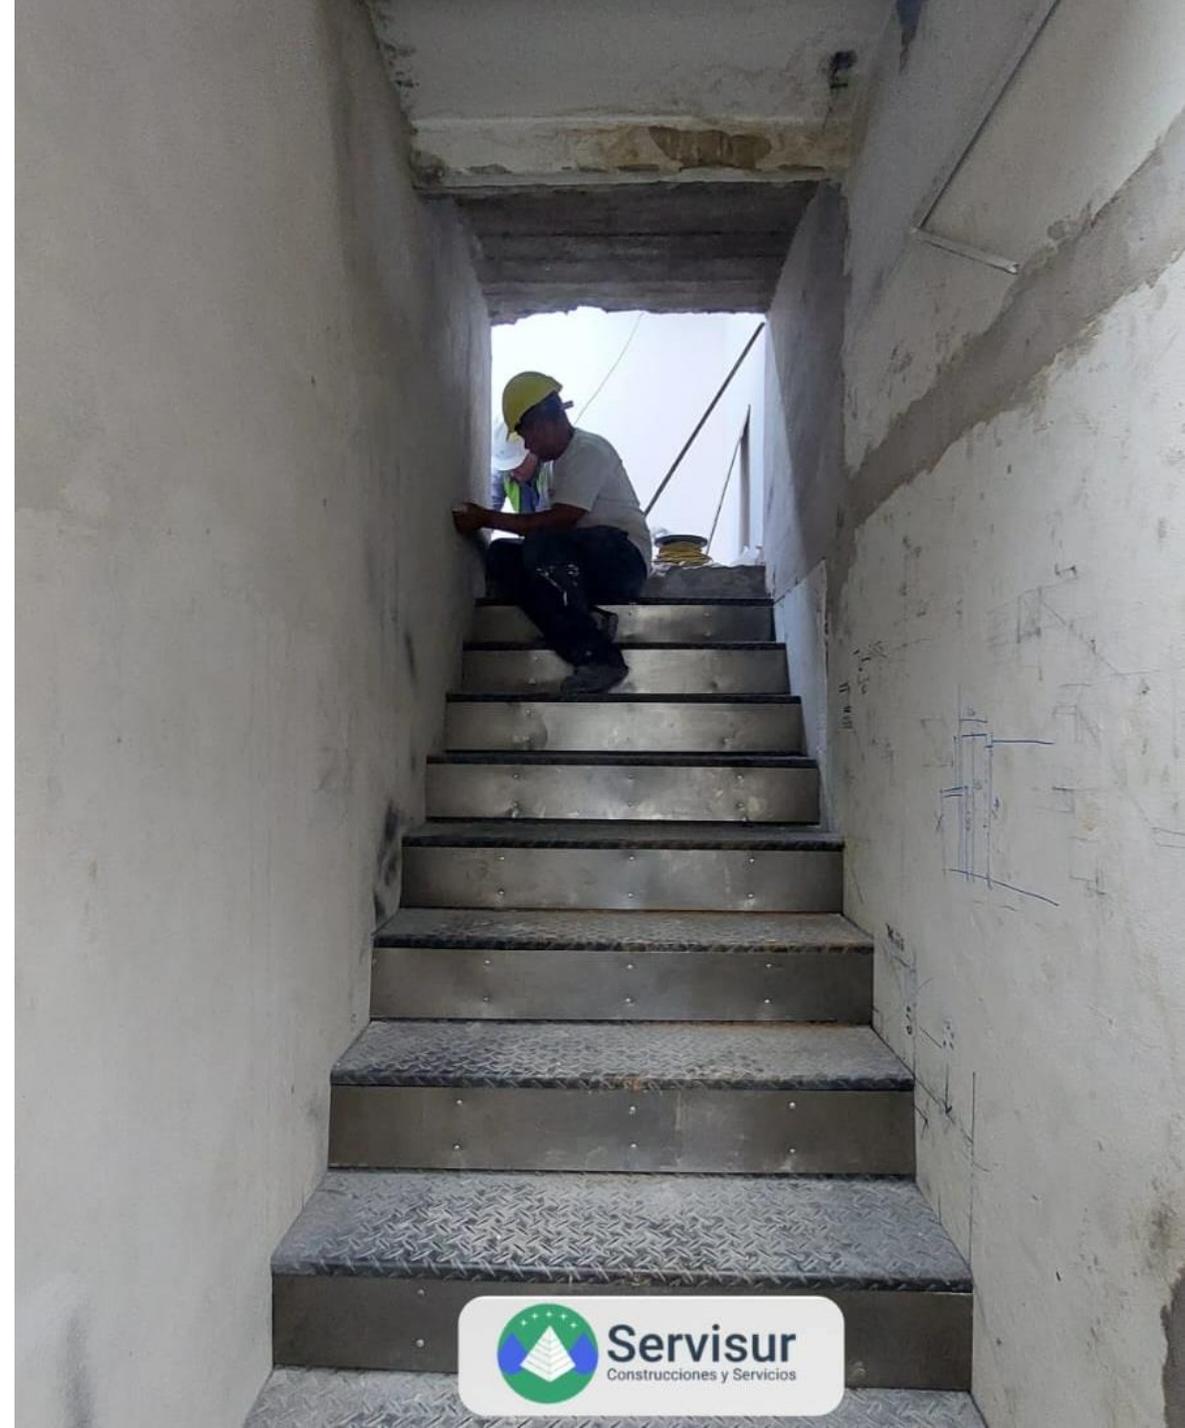

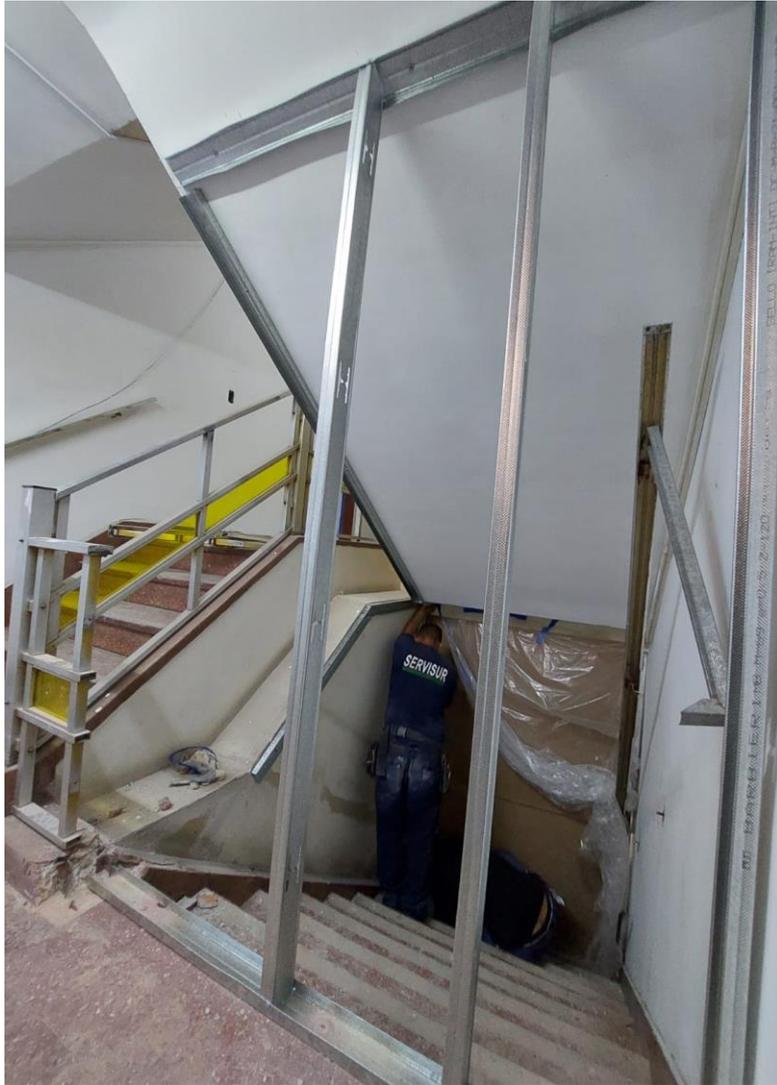

- Construcción de pared de Durlock
- Colocación de soleras y montantes con sus respectivas medidas.

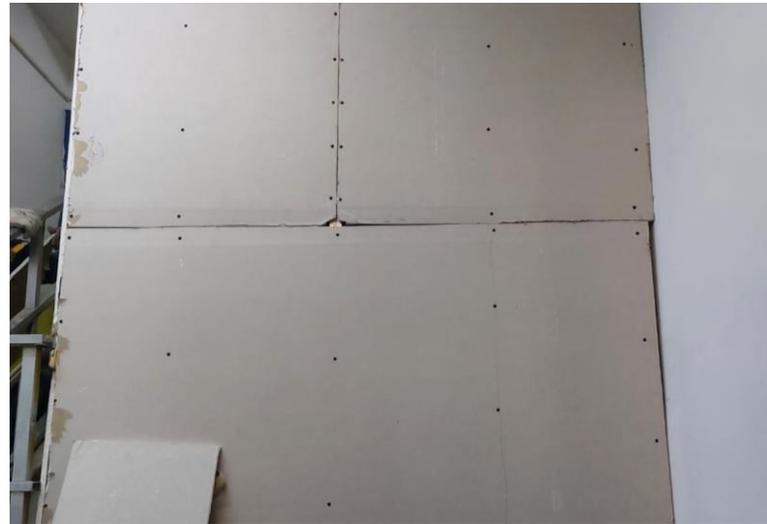


SALIDA
AUXILIAR
SBASE Y
EMOVA

SALIDA AUXILIAR SBASE Y EMOVA



- Construcción de mampostería
- Revoque
- Pintura
- Demolición de losa existente

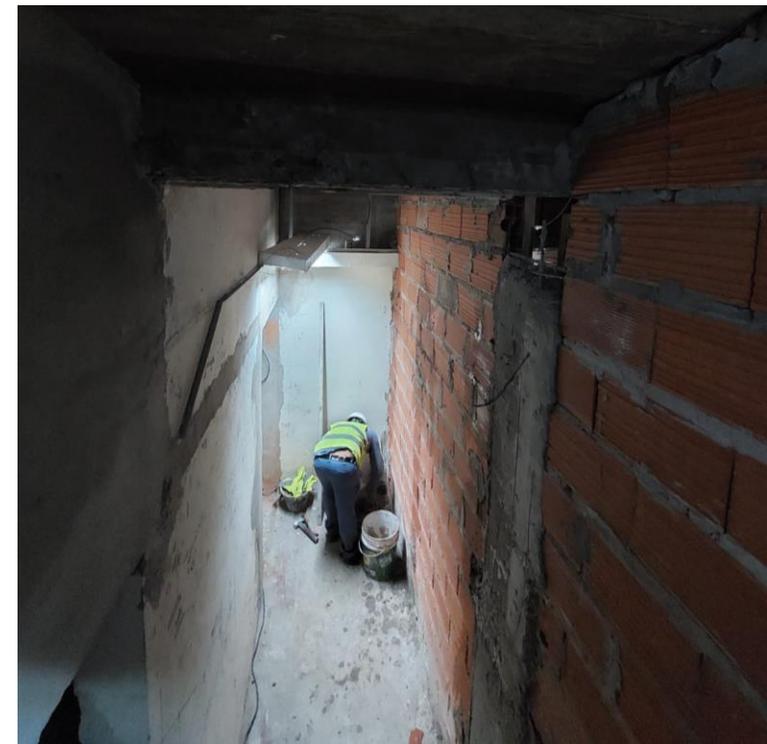



- Lijado y pintura de todo el recorrido de escalera existente
- Limpieza diaria




SALIDA
AUXILIAR
SBASE Y
EMOVA

SALIDA AUXILIAR SBASE Y EMOVA



- Lijado de paredes existentes
- Pintura de segundo piso y sala de mantenimiento de color blanco.
- Limpieza diaria de obra.

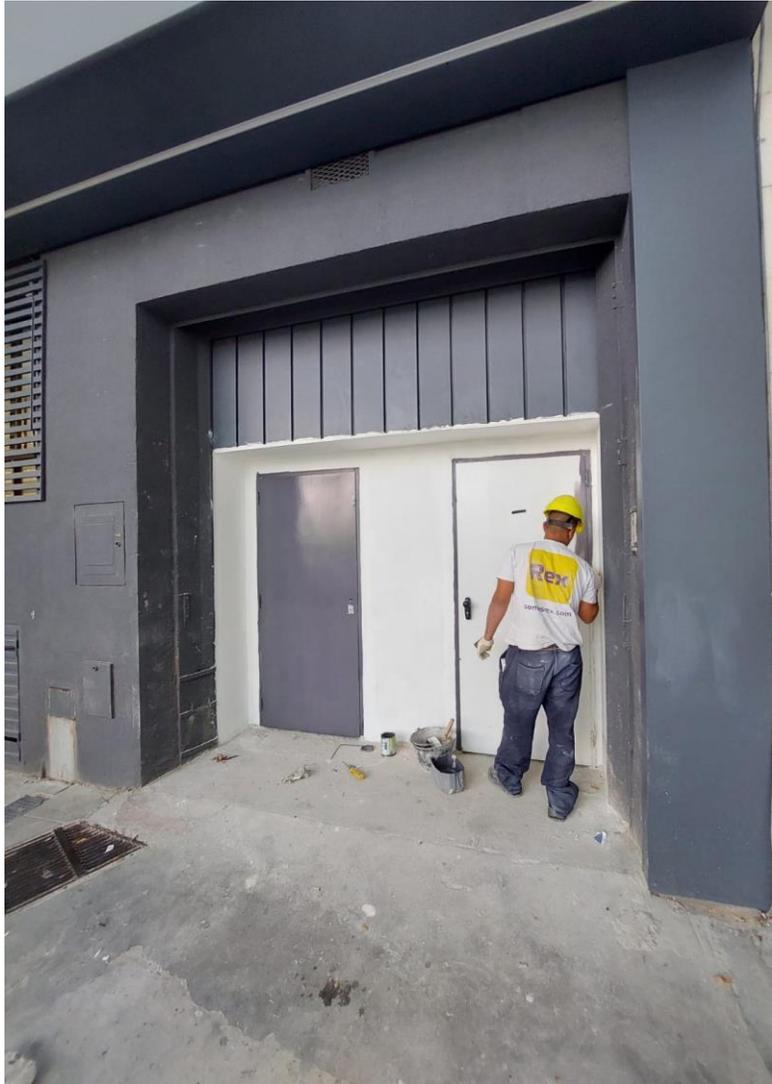

- Colocación de dos puertas
- Pintura de puertas y paredes.

SALIDA
AUXILIAR
SBASE Y
EMOVA



SALIDA AUXILIAR SBASE Y EMOVA

- Colocación de pasamanos en pasillo interior de la salida auxiliar
- Limpieza diaria de obra.



¡Gracias!
